


## 6 道央廃棄物処理組合 令和 4 年度業務報告及び令和 5 年度業務計画について

## 1 道央廃棄物処理組合焼却施設の概要

- ・施設名称：道央廃棄物処理組合焼却施設
- ・所在地：千歳市根志越 2533-1 外（下図のとおり）
- ・施設規模：地下 1 階地上 6 階建
- ・焼却能力：158 t / 日 (79 t × 2 炉) 焼却熱を利用した発電設備を設置
- ・発電能力：約 1,500 万 kwh/年 環境省統計データから算定すると、1,500 万 kwh は、一般家庭約 3,500 世帯の年間使用量に相当する電力量

《新焼却施設周辺図》

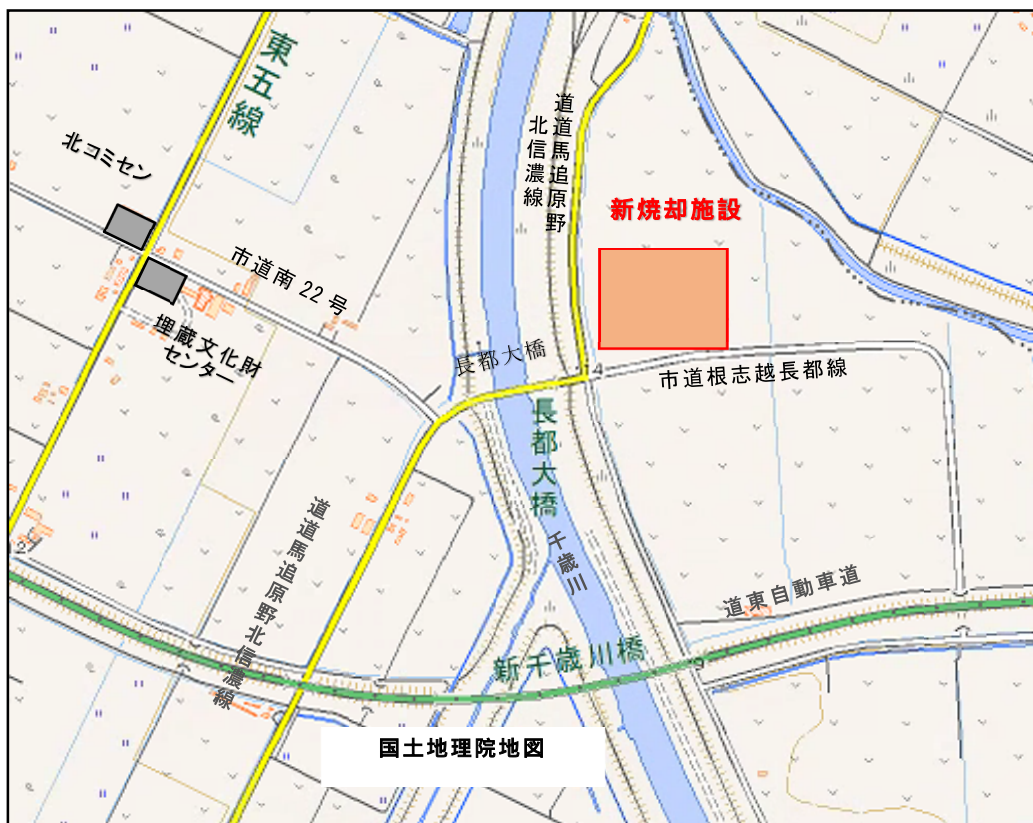

## 2 令和 4 年度業務報告

## (1) 焼却施設建設工事について

令和 4 年度は焼却施設の建築工事、プラント工事を実施しました。

令和 4 年度末の進捗率は、全体の約 56% となり、順調に工事が行われました。

(2) 焼却施設の「管理運営事業者」選定業務について

焼却施設完成後、施設を安全で安定的・経済的に管理運営するため、20年間の長期包括運営委託を行うこととして、令和4年度から運営事業者の選定を実施しています。

事業者の選定には、公募型プロポーザル方式を採用し、学識経験者等3名、行政職員2名、計5名で組織する『プロポーザル選定委員会』により、客観性と透明性を確保して提案書やプレゼンテーションの内容を公正に審査し、事業者(優先交渉権者)を選定することとしています。

令和4年12月には、公募広告(募集要項等の公表)を行い、事業者の募集を開始しました。

(3) 最終処分場建設基礎資料作成委託について

令和4年度は最終処分場建設の候補地を選定するための第1段階として専門業者に委託し、基礎資料を作成いたしました。

### 3 令和5年度業務計画

(1) 焼却施設建設工事について

建設工事の進捗については、本年6月末において約68パーセントで、順調に工事が進んでおり、本年11月に外構工事を除く工事を概ね完了させ、12月から試運転を開始し、令和6年4月から供用開始となります。

(2) 焼却施設の「管理運営事業者」選定業務について

現在、公募型プロポーザル方式による事業者の選定を進めており、本年7月に優先交渉権者を決定し、8月には委託契約を締結する予定としております。

(3) 最終処分場建設基礎資料作成委託について

最終処分場建設候補地の選定に向け準備を進めていきます。

<参考>

1 包括(的)運営委託とは

受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に運営できるよう、複数の業務や施設を包括的に委託すること。
