

付 録

工事成果品 目録

工事名：


受注者：

- ① 施工計画書
- ② 履行報告書(工事旬報)
- ③ 工事施工協議簿
- ④ 立会願及び段階確認願
- ⑤ 社内検査報告書
- ⑥ 工事写真
- ⑦ 出来形図
- ⑧ 出来形測定表、搬入材料総括表
- ⑨ 資材承認願
- ⑩ 品質管理
- ⑪ 試験成績表
- ⑫ 安全訓練等実施報告書
- ⑬ 建設副産物搬出集計表
- ⑭ 管内カメラ調査報告書
- ⑮ 現場環境改善
- ⑯ その他

※1 納品書・産業廃棄物管理票(マニフェスト)・交通誘導警備員集計表(伝票を含む)(は、受注者で5年保管

※2 ⑮は、表示しないで提出

業務の流れ

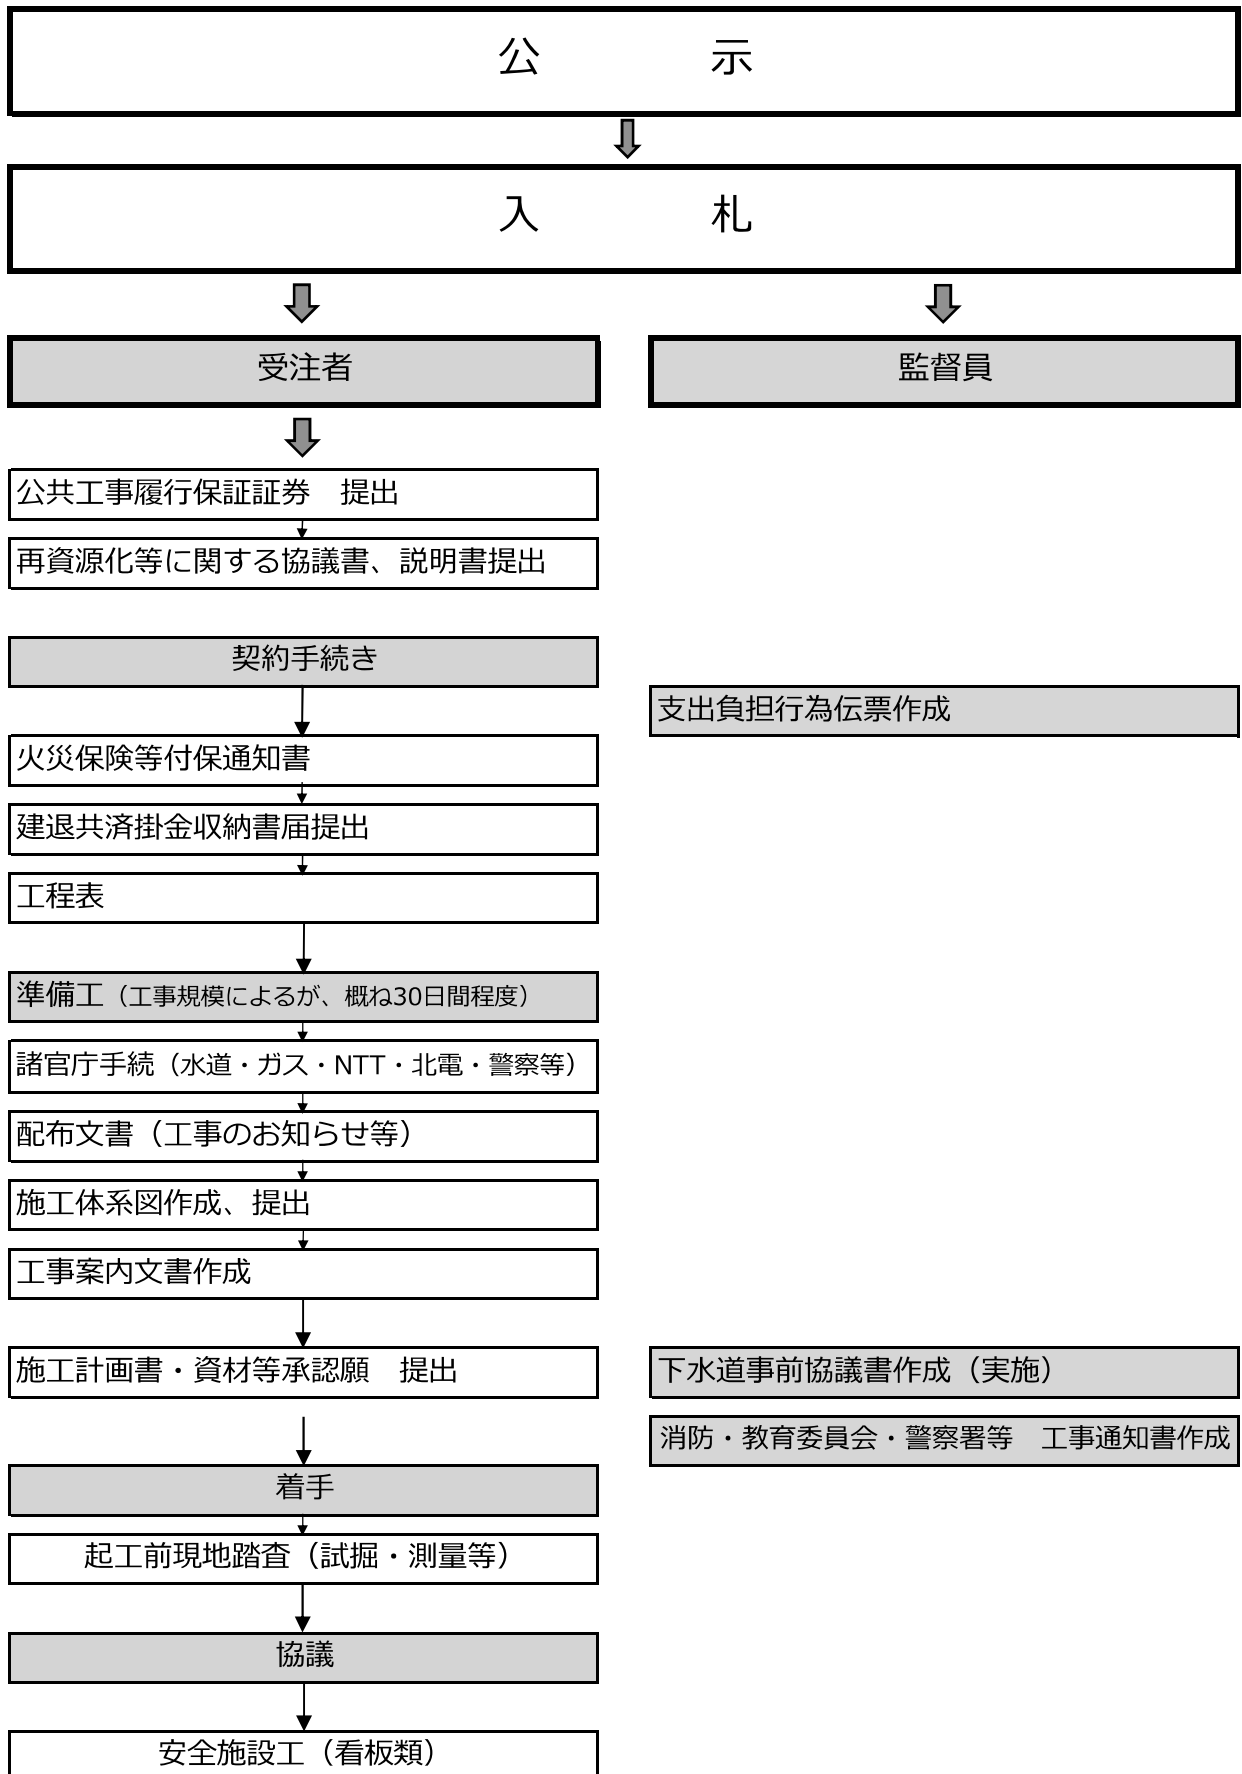

土工の出来形測定表

(単位：mm)

路線名	管種	管径	基礎	項目	土 工							備 考		
					幅 (m)			深さ (m)						
					SP=20	SP=40	SP=60	SP=20	SP=40	SP=60				
				測定値										
				設計値										
				差										
				測定値										
				設計値										
				差										
				測定値										
				設計値										
				差										
				測定値										
				設計値										
				差										
				測定値										
				設計値										
				差										
				測定値										
				設計値										
				差										

土工の出来形測定表 (記入例)

(単位：mm)

路線名	管種	管径	基礎	項目	土 工							備 考			
					幅 (m)			深さ (m)							
					SP=20	SP=40	SP=60	SP=20	SP=40	SP=60					
汚水A B C	P R P	200	砂90°	測定値	1.550	1.520	1.500	1.235	1.285	1.200					
				設計値	1.500	1.500	1.500	1.240	1.299	1.213					
				差	-0.05	-0.020	0.00	0.005	0.014	0.013					
				測定値											
				設計値											
				差											
				測定値											
				設計値											
				差											
				測定値											
				設計値											
				差											
				測定値											
				設計値											
				差											
				測定値											
				設計値											
				差											

(単位: mm)

路線名	管外径	基礎材幅 設計値	卷材幅 (L)	S P = 20		S P = 40		S P = 60		基礎材厚 設計値	S P = 20		S P = 40		S P = 60		備考
				実測値	差	実測値	差	実測値	差		実測値	差	実測値	差	実測値	差	

(単位: mm)

[illegible]

課 長	係 長	係

No6

提出年月日 2018年4月10日

現場代理人氏名 ㊞

監督員氏名 ㊞

工 事 旬 報

工事名

月日	曜日	予 定	実 績		天気
		工種施工内容	予定 どおり	変更実施内容	
4月1日	日曜日	休日			
4月2日	月曜日	汚水1234路線 SP=123～SP130 仮設・掘削・管布設・仮路面復旧			
4月3日	火曜日	No3 汚水人孔設置工			
4月4日	水曜日	発進立坑ライナープレート設置			
4月5日	木曜日	薬液注入工 到達立坑No3			
4月6日	金曜日	汚水1234路線 SP=130～SP140 仮設・掘削・管布設・仮路面復旧			
4月7日	土曜日	汚水2345路線 取付管工 NO3,4,5,6			
4月8日	日曜日	休日			
4月9日	月曜日	舗装本復旧 雨水567路線			
4月10日	火曜日	No1 雨水人孔設置工			
注1) 実績を提出する際は、平面図に実施箇所を赤色で表示し提出すること。 注2) 監督員から指示があった場合は、予定-実績工程表(図)も添付すること。 注3) 上表のとおり、概ね8割程度の予定が実施できた場合は、予定どおり進捗したこととする。					前月末の出来形
					%
特記事項					4月10日現在の出来形
					%

課 長	係 長	係

No7

提出年月日 2018年4月10日
現場代理人氏名
監督員氏名

工 事 旬 報

工事名

月日	曜日	予 定	実 績		天気
		工種施工内容	予定 どおり	変更実施内容	
4月1日	日曜日	休日	○		快晴
4月2日	月曜日	汚水1234路線 SP=123～SP130 仮設・掘削・管布設・仮路面復旧	×	No3人孔設置	曇/晴
4月3日	火曜日	No3 汚水人孔設置工	×	汚水1234路線 SP=123～SP133 仮設・掘削・管布設・仮路面復旧	小雨
4月4日	水曜日	発進立坑ライナープレート設置	×	薬液注入工 到達立坑No3	薄曇
4月5日	木曜日	薬液注入工 到達立坑No3	×	写真整理、保安設備点検	大雨
4月6日	金曜日	汚水1234路線 SP=130～SP140 仮設・掘削・管布設・仮路面復旧	○	汚水1234路線 SP=133～SP140 仮設・掘削・管布設・仮路面復旧	晴/曇
4月7日	土曜日	汚水2345路線 取付管工 NO3,4,5,6	○	汚水2345路線 取付管工 NO3,4,5,6、7	曇り
4月8日	日曜日	休日	○		大雪
4月9日	月曜日	舗装本復旧 雨水567路線	○	舗装本復旧 雨水567路線、 汚水1234路線 SP=130～140	快晴
4月10日	火曜日	No1 雨水人孔設置工	×	No1雨水人孔覆工板設置まで (掘削深1.5m支保工1段設置)	雨
注1) 実績を提出する際は、平面図に実施箇所を赤色で表示し提出すること。 注2) 監督員から指示があった場合は、予定-実績工程表(図)も添付すること。 注3) 上表のとおり、概ね8割程度の予定が実施できた場合は、予定どおり進捗したこととする。					前月末の出来形
					%
特記事項					4月10日現在の出来形
					%

搬入材料総括表

(例)

[illegible]

注) 納品書は、5年間受注者が保管すること。

令和 年 月 日

町 内 の 皆 様 へ

下水道工事のお知らせ(案)

平素から、千歳市の下水道事業にご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、この度 にて、下水道工事を行うことになりました。工事中は何かとご迷惑をかける場合もありますが、ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

千歳市水道局下水道整備課下水道工事係

TEL

工事施工者

TEL

(1) 工 事 名 :

(2) 工事内容:

(3) 工 期： 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

(4) 位置圖：

[illegible]
