令和７年度千歳市週休２日工事受注者アンケートの結果について

令和８年 10 月　千歳市建設部事業庶務課作成

令和７年度　千歳市週休２日工事の実施結果について


本市は、建設業の働き方改革に資するために令和５年度からの試行を経て、令和７年度から週休２日工事を実施しています。

令和７年度に完了した工事 129 件（市長部局 78 件、水道局 51 件）のうち、週休２日工事 94 件（市長部局 70 件、水道局 24 件）を実施しています。

受注者アンケートの結果

令和７年度に週休２日工事を受注した 53 社にアンケートを実施し、52 社（回答率 98.11%）から回答をいただき、うち３社は工事毎に回答があったため、総回答数は 55 件です。

１．実施状況について

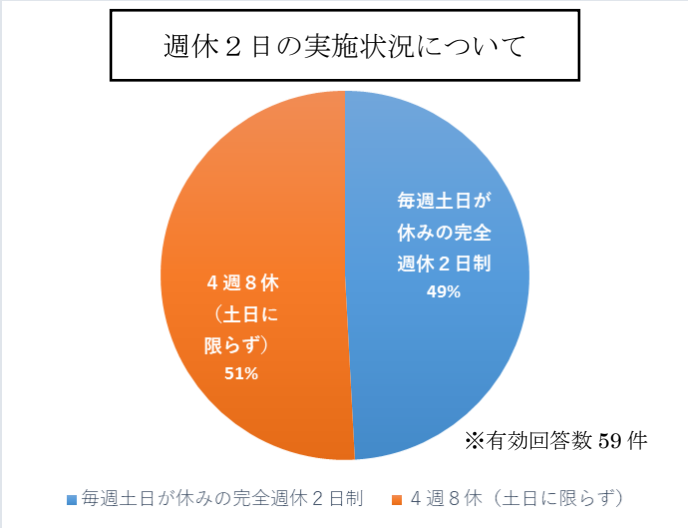


※実施状況は１回答内で複数の工事について回答もあったため、有効回答数を 59 件としています。

【週休２日工事の達成にあたっての感想や工夫・苦労したことについて】

・雨天作業中止の判断が難しく、小雨での作業が増えたり、業者の日程調整が難しかった。
・無理のない程度の残業や工事工程管理をしっかり行うなどの工夫を行った。
・協力企業には契約前に週休２日であることを説明したので、日給制の作業員からの不満もなかった。
・施工する施設側との調整や平日の工事の進行調整に苦労した。
・学校関連工事は登校時間以外に作業を行ったり、夏休み中に作業を集中させるなどの工程管理を工夫した。
・工期設定に余裕があったため難なく達成できた。
・工期終盤になると日程的に週休２日とする現場閉所の余裕がなくなることがある。
・客先要望や施工する施設側の都合で土日を作業日とし、平日に代休取得を実施した。
・人手不足に悩まされた。
・働き方改革に沿って休日の設定や繁忙期と閑散期での変形労働時間制を利用した。
・屋外工事は天候に左右され、平日に雨で休工した場合、土曜日工事をするなど工夫した。
・祝日や降雪による不稼働により稼働日が制限され、工程遅延への対処と経済的負担に悩んだ。


２．工期設定について

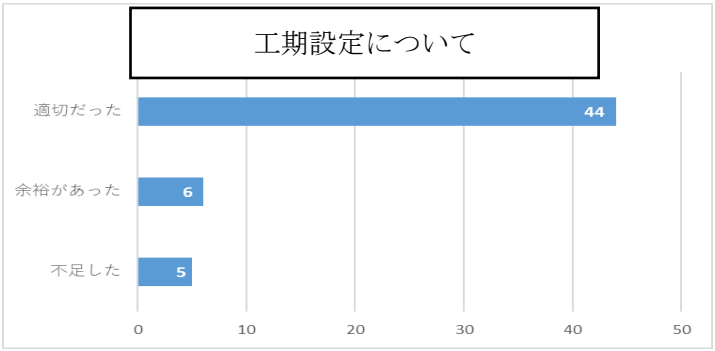


【工期不足の理由や対策について】

・学校暖房機の更新は工期不足というより施工可能期間不足と感じた。
・時期に見合わない内容、工期だった。
・夏季工事において連休が重なり、下請事業者等の確保に難航したが休日出勤手当で対策した。
・掘削工事にも関わらず、工期が秋から冬に設定されたため。
・国有林伐採認可が遅れたため、設計数量を工期内で完了するよう調整した。

３．メリットについて（複数選択可）

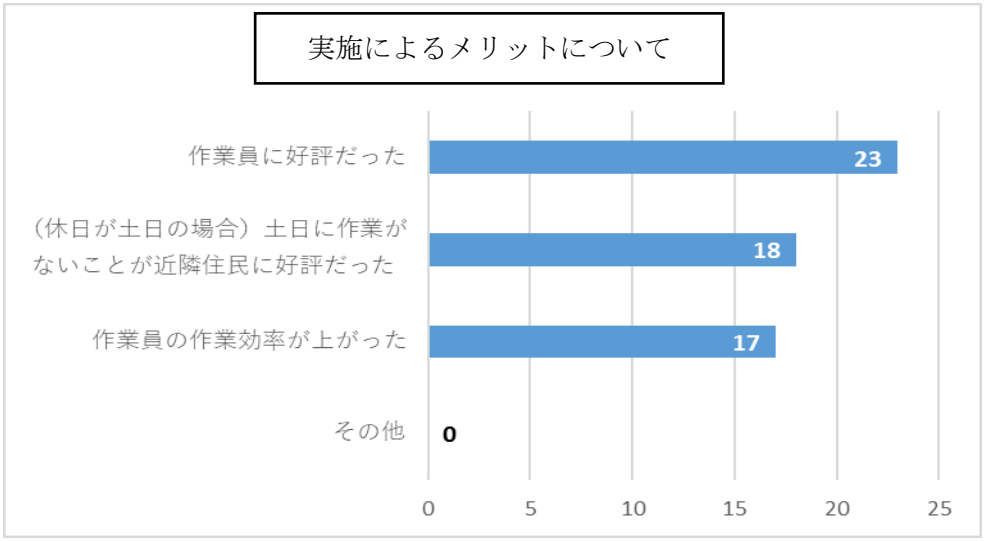

４．デメリットについて（複数選択可）

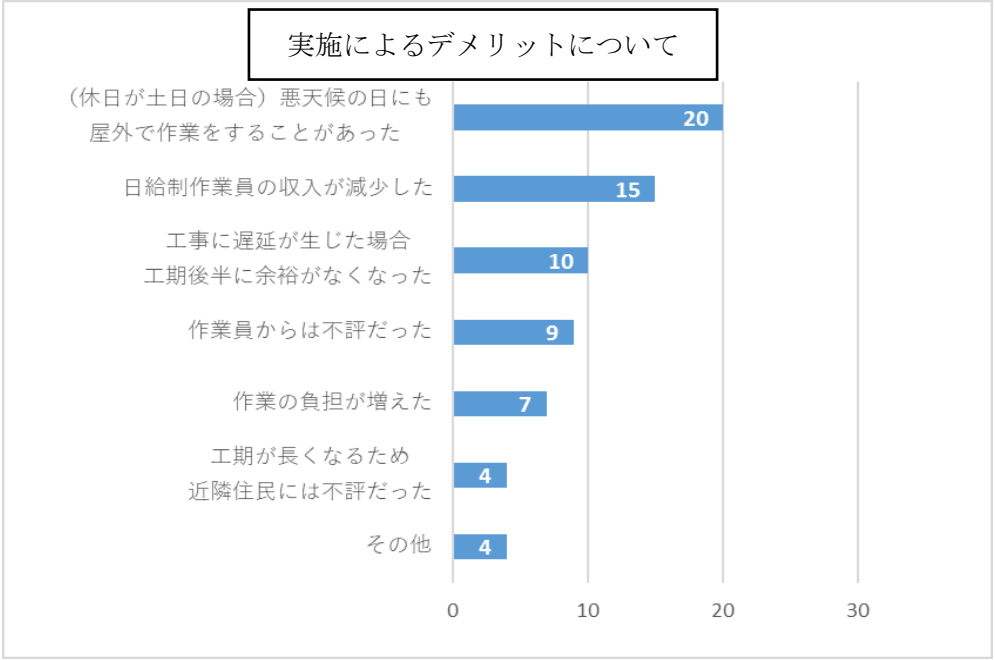

【デメリットにおけるその他】の主な回答内容

・工期が長くなるため現場管理費負担が増えるが、補正経費が少ない。


・労務者・作業員を給料制で通年雇用しているため、週休２日に加え、悪天候による不稼働日が多くなると経済的負担が大きかった。

・稼働日が減った分を平日の残業により埋め合わせたが、協力業者で日給・月給の労働者は収入が減ることを心配していた。


・職人の少ない会社は作業員の日程調整が大変である。

・日給制の作業員は週休２日で現場閉所した日は別の現場で仕事をするため、週休２日制の意味がない。

５．週休２日を実施しない工事と比べて時間外労働の状況はどうだったか

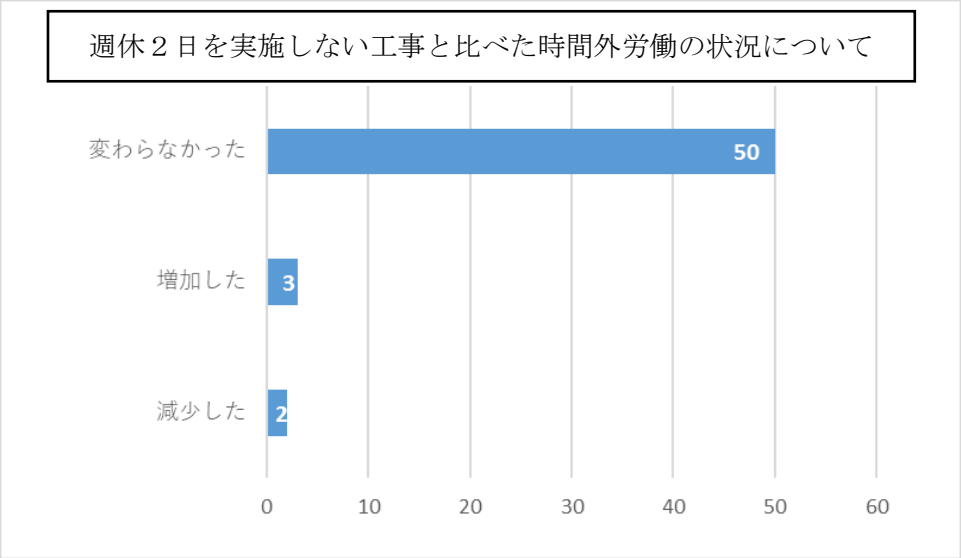


６．補正経費（労務費・諸経費等）の活用用途について（複数選択可）

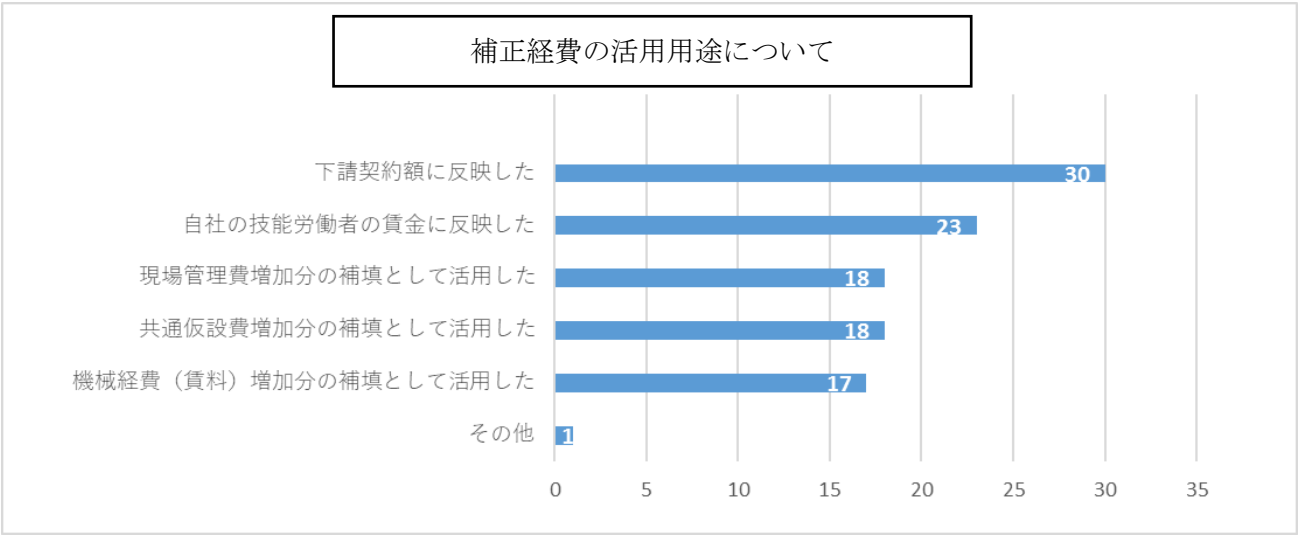

【補正経費の活用用途のその他】の回答内容について

・リースする機械や大型クレーンの回数を増やし作業効率を上げたため、その増加費用に充て作業員不足にも対応した。


７．完全週休２日工事について

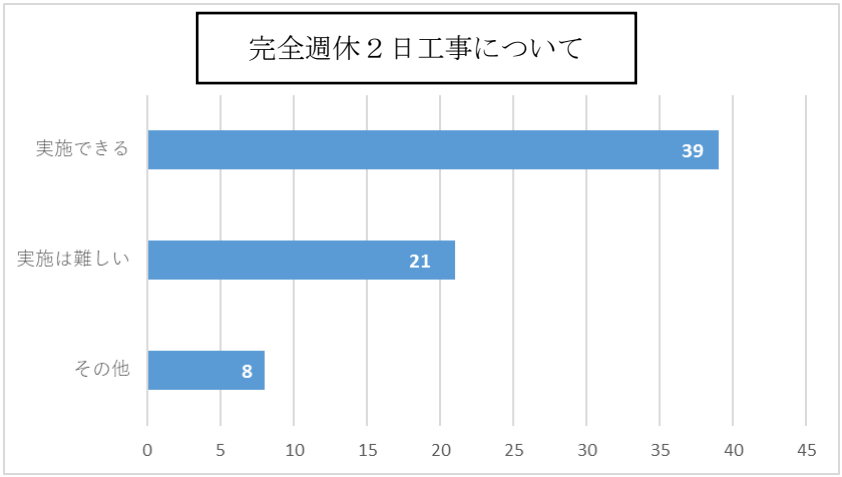

【完全週休２日工事のその他】の主な回答内容について

・工期に余裕があったため、完全週休２日を実施できた。
・業者や業種によっては職人の確保が困難である。
・平日に雨等で作業を中止にした際、工程遅延が近隣に迷惑がかかる場合は土曜日に作業をすることがある。
・資材業者が土日休日の場合、土日は作業を止めざるをえない。
・完全週休２日は工種や施工量にも左右されるため、実際に取り組んでみないと分からない
・雨天中止や現場でトラブルが起こり平日作業できなかった場合、土曜日に作業するなど柔軟に対応できるのか。

８．週休２日工事に係る経費の補正について

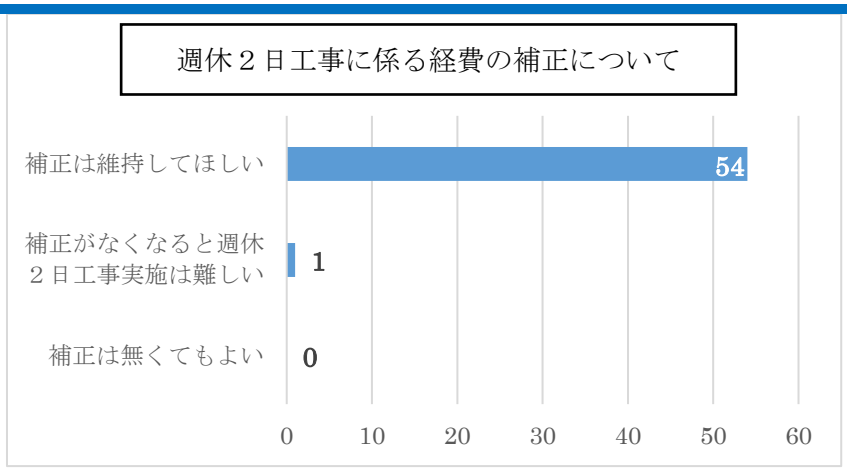

【週休２日工事に係る経費の補正が無くなると週休２日で工事施工が困難な理由】について

・工事現場に応じて工事期間や発注金額を臨機応変に見直して頂けるならストレス無く実施は可能である

９．自由意見記載について

結果に対する主な内容

(1)週休２日にするメリットが何も感じられなかった。
(2)施工時期と施工区域が千歳神社祭や航空祭のエリアに重なり、一部の期間は一切の作業ができなかった。

意見・希望・要望に関する主な内容

(1)今年は中東情勢の影響に伴う、ナフサ等石油関連製品の供給制約により製品材料の納入が遅れたので、業務委託等でも早期の発注をお願いしたい。
(2)市外のゼネコン業者が千歳市の公共工事を受注した際、下請け企業に地元企業を活用していない、依頼もしていないのが現状であるため、地元は地元企業で盛り上げるようもっと声を上げてほしい。
(3)入職者確保のため、千歳市でも建設業に必要な資格取得に補助を行ってほしい。
(4)工事規模が大きい場合、写真撮影基準や出来形測定基準の緩和をお願いしたい。
(5)工期設定に冬期間を含めないでほしい。
(6)公共工事は民間工事に比べて書類の量が多すぎるため、技術者の成り手が不足しているのが現実である。
(7)改修工事では施設を使用している物件の管工事施工は大変苦労が多いため、今の価格では健全な利益が出ない。
(8)週休２日工事の補正維持を希望するとともに、補正率をもう少し高くしてほしい。
(9)近年人材確保のために未経験者を多く採用し、弊社現場員も担い手育成のために努力していますので、発注者の皆様にもこれまで同様のご協力・ご指導をお願いします。
(10) 週休２日工事の増額補正は嬉しいが、そもそも発注単価が実態に合わないところがあるので、そちらの見直しをお願いしたい。
(11) 建設業の人出不足が続いているので、建設業従事者の待遇改善、特に給与の充実のため、単価の見直しをこまめに実施してほしい。
(12) 夏季の猛暑日が続くと作業効率が著しく低下し、各社も機械化の推進や猛暑対策などでの増加費用に苦しんでいるので熱中症対策費用を計上してほしい。
(13) 土曜日は他の現場で作業をするため、働きやすさには繋がらない。
(14) 冬期間は舗装の可・不可に直結するので降雪前の工期となるように発注してほしい。
(15) 青葉公園の工事は現場の場所がクロスカントリーのコースだったのか、工事期間中もクロスカントリーを行う人がいたので、市の方で中止期間を設けるなど、工事に配慮してほしい。
(16) 完全週休２日制を導入することで、建設業界において不足している若手人材の入職促進が期待できる。
(17) 完全週休２日制は在職者についても家族との時間や趣味に充てる時間が確保しやすくなることから、働きやすい職場環境の整備につながる良い取組であると感じている。
(18) 施工時期にお盆などの長期休暇がある場合は機械や資材の搬入に日数がかかるので、工期に多少の余裕がほしい。

１０．最後に

週休２日工事受注者アンケートへの回答にご協力いただきまして誠にありがとうございます。
いただいたご意見は今後千歳市が発注する工事の参考にさせていただきます。
